


बुन्देलखण्ड पैकेज

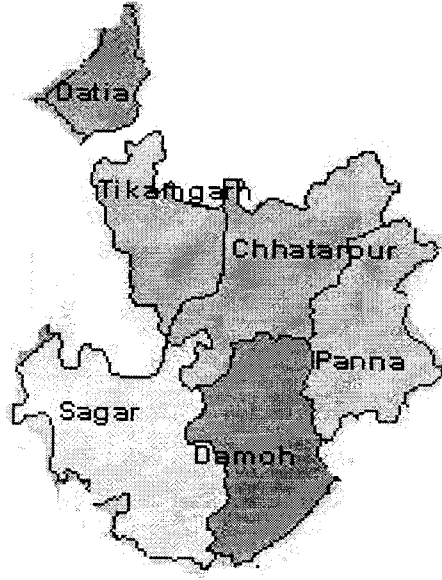

विद्युत/डीजल पम्प सेट प्रदाय एवं स्टाप डेम निर्माण की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

माह मार्च 2016

बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण (ACA मद)

कपिल धारा कूओं पर विद्युत/डीजल पम्प प्रदाय

विवरण	प्रथम चरण	द्वितीय चरण (2013-14 से 2016-17 तक)
कुल प्रावधानित राशि	रु. 80.00 करोड़	रु. 25.00 करोड़
कुल प्राप्त राशि	रु. 80.00 करोड़	रु. 4.15 करोड़
जिलों को प्रदाय राशि	रु. 80.00 करोड़	रु. 4.15 करोड़
व्यय राशि	रु. 77.88 करोड़	रु. 6.60 करोड़
भौतिक लक्ष्य संख्या	40,000	10,000
पम्पसेट प्रदाय हेतु चिन्हित हितग्राहियों की संख्या	39,308	3482
पम्पसेट प्रदाय हेतु जारी कार्यादेश की संख्या	39,308	3438
कुल स्थापित पम्पों की संख्या	38,737	2785

नदी नालों पर श्रंखलाबद्ध स्टाप डेम- ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विकास आयुक्त कार्यालय से प्राप्त जानकारी के आधार पर

- ✓ कुल प्रावधानित राशि रु. 130 करोड़
- ✓ जिलों को प्रदाय राशि रु 130 करोड़
- ✓ स्वीकृत स्टाप डेम की संख्या - 353
- ✓ पूर्ण स्टाप डेम की संख्या - 344
- ✓ प्रगतिरत स्टाप डेम की संख्या-06 (01 फाऊंडेशन लेवल एवं 05 सुपर स्ट्रकचर लेवल)
- ✓ निरस्त स्टाप डेम की संख्या- 03 (टीकमगढ जिले के 02 एवं दतिया जिले का 01 स्टापडेम निरस्त किये जा चुके है)
- ✓ कुल व्यय राशि रु. 113.28 करोड़

प्रथम चरण

पम्पसेट प्रदाय एवं स्टापडेम निर्माण की अद्यतन वित्तीय प्रगति (राशि करोड में)

क्र	विवरण	स्वीकृत राशि	ACA से प्राप्त			जिलों को प्रदाय राशि	व्यय	प्रतिशत	उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
			I	II	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पम्प सेट प्रदाय	80.00	45.00	35.00	80.00	80.00	77.88	97%	76.59
2	स्टापडेम निर्माण	130.00	26.40	103.60	130.00	130.00	113.28	87%	109.69
	योग	210.00	71.40	138.60	210.00	210.00	191.16	91%	186.28

द्वितीय चरण

पम्पसेट प्रदाय की अद्यतन वित्तीय प्रगति (राशि करोड में)

क्र	विवरण	स्वीकृत राशि	ACA से प्राप्त राशि			जिलों को प्रदाय राशि	व्यय	प्रतिशत	उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
			I	II	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पम्प सेट प्रदाय	25.00	4.15	0	4.15	4.15	6.60	159%	6.13

टीप :- द्वितीय चरण हेतु केवल रू. 4.15 करोड़ प्राप्त हुये हैं। शेष राशि बुन्देलखण्ड पैकेज मद में प्राप्त ब्याज की राशि से व्यय किया गया है। शेष राशि रू. 20.85 करोड़ प्राप्त करने की कार्यवाही प्रचलन में है।

बुन्देलखण्ड पैकेज अंतर्गत
ACA मद से
पम्प सेट प्रदाय की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति (प्रथम चरण)

माह मार्च 2016 की स्थिति में

प्रपत्र 01

क्रमांक	जिले का नाम	भौतिक प्रगति					वित्तीय प्रगति		
		भौतिक लक्ष्य	चिंहित हितग्राही	पम्प प्रतिस्थापना हेतु जारी आदेश (हितग्राहियों की संख्या)	स्थापित पंपों की संख्या	लक्ष्य पूर्ति हेतु शेष पंपों की संख्या	वित्तीय लक्ष्य (रु.करोड़ में)	जिले को प्रदाय राशि (रु.करोड़ में)	पम्प सेट हेतु विमुक्त अनुदान की राशि (रु.करोड़ में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सागर	6568	6568	6568	6568	0	13.1360	13.1360	13.1360
2	छतरपुर	9081	9081	9081	9081	0	18.1620	18.1620	18.1345
3	दमोह	8223	8223	8223	8223	0	16.4460	16.4460	16.3194
4	टीकमगढ़	8754	8062	8062	8062	692	17.5080	17.5080	16.1240
5	पन्ना	6974	6974	6974	6403	571	13.9480	13.9480	13.3814
6	दतिया	400	400	400	400	0	0.8000	0.8000	0.7815
योग		40000	39308	39308	38737	1263	80.0000	80.0000	77.8768

नोट :- 1. प्रथम चरण के लक्ष्य पूर्ति के उपरांत ही द्वितीय चरण हेतु पम्प सेट प्रदाय करने की कार्यवाही की जाना है।

2. दमोह, छतरपुर, सागर एवं दतिया जिलों में प्रथम चरण के लक्ष्य पूर्ति उपरांत, द्वितीय चरण हेतु हितग्राही चिंहित करते हुए प्रथम किश्त भी जारी की गई है।

3. राज्य योजना आयोग से द्वितीय किश्त की राशि प्राप्त न होने से बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज मद के अंतर्गत जिले में उपलब्ध ब्याज की राशि से भुगतान किया जा रहा है।

प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल

बुन्देलखण्ड पैकेज अंतर्गत ACA मद से स्टापडेम निर्माण की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति (प्रथम चरण)

ह मार्च 2016 की स्थिति में

प्रपत्र - 02

क्र.	जिला	वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति							
		वित्तीय लक्ष्य (रु.करोड़)	जिले को प्रदाय राशि (रु.करोड़)	व्यय राशि (रु.करोड़)	भौतिक लक्ष्य	स्वीकृत कार्यों की संख्या	प्रगतिरत कार्यों की संख्या	पूर्ण कार्यों की संख्या	अप्रारंभ कार्यों की संख्या	प्रगतिरत कार्य		
										फाऊंडेशन लेवल	सुपर स्ट्रक्चर लेवल	योग
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	सागर	40.17	40.17	34.40	84	84	3	81	0	0	3	3
2	छतरपुर	24.27	24.27	21.62	86	86	0	86	0	0	0	0
3	दमोह	18.55	18.55	17.09	53	53	0	53	0	0	0	0
4	टीकमगढ़	20.88	20.88	17.81	67	67	2	63	2	1	1	2
5	पन्ना	15.78	15.78	12.47	35	35	1	34	0	0	1	1
6	दतिया	10.35	10.35	9.89	28	28	0	27	1	0	0	0
	महायोग	130.00	130.00	113.28	353	353	6	344	3	1	5	6

ट - टीकमगढ़ जिले के 02 कार्य एवं दतिया जिले के 01 कार्य निरस्त किये गये हैं। सागर जिले में 04 कार्य डूब क्षेत्र अंतर्गत हैं।

बुन्देलखण्ड पैकेज अंतर्गत

ACA मद से

पम्प सेट प्रदाय की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति (द्वितीय चरण)

माह मार्च 2016 की स्थिति में

प्रपत्र - 03

क्रमांक	जिले का नाम	भौतिक प्रगति					वित्तीय प्रगति		
		भौतिक लक्ष्य	चिह्नित हितग्राही	ऐसे हितग्राहियों की संख्या जिनके लिए प्रथम किशत हेतु 60 % की राशि जारी की गई	स्थापित पंपों की संख्या	लक्ष्य पूर्ति हेतु शेष पंपों की संख्या	वित्तीय लक्ष्य (रु.करोड़ में)	जिले को प्रदाय राशि (रु.करोड़ में)	पम्प सेट हेतु विमुक्त अनुदान की राशि (रु.करोड़ में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सागर	1417	1417	1417	1047	370	3.5425	1.5450	1.9305
2	छतरपुर	2820	1327	1327	1232	1588	7.0500	1.8025	3.4004
3	दमोह	1906	663	663	506	1400	4.7650	0.7500	1.2245
4	टीकमगढ़	1939	0	0	0	1939	4.8475	0.0000	0.0000
5	पन्ना	1618	0	0	0	1618	4.0450	0.0000	0.0000
6	दतिया	300	75	31	0	300	0.7500	0.0525	0.0465
योग		10000	3482	3438	2785	7215	25.0000	4.1500	6.6019

नोट :- 1. प्रथम चरण के लक्ष्य पूर्ति के उपरांत ही द्वितीय चरण हेतु पम्प सेट प्रदाय करने की कार्यवाही की जाना है।

2. दमोह, छतरपुर, सागर एवं दतिया जिलों में प्रथम चरण के लक्ष्य पूर्ति उपरांत, द्वितीय चरण हेतु हितग्राही चिह्नित करते हुए प्रथम किशत भी जारी की गई है।

3. टीकमगढ़ एवं पन्ना जिले में प्रथम चरण के लक्ष्य की पूर्ति न होने के कारण द्वितीय चरण की कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई है।

3. राज्य योजना आयोग से द्वितीय किशत की राशि प्राप्त न होने से बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज मद के अंतर्गत जिले में उपलब्ध ब्याज की राशि से भुगतान किया जा रहा है।

MGNREGS अंतर्गत सम्पन्न कार्य (प्रथम चरण)

ह मार्च 2016 की स्थिति में

प्रपत्र -04

क्र.	जिले का नाम	स्वीकृत कार्यों का विवरण			पूर्ण कार्यों का विवरण					
		कुँआ	खेत तालाब	जल संवर्द्धन के कार्य	पूर्ण कार्यों की संख्या			पूर्ण कार्यों पर व्यय राशि (करोड़ में)		
					कुँआ	खेत तालाब	जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार, पुनर्जीवन, पुनर्भरण इत्यादि जैसे - लघु तालाब व माईनर नहरों का रखरखाव, जल पुनर्भरण, तालाबों का गहरीकरण व जीर्णोद्धार (गाद निकालने सहित)।	कुँआ	खेत तालाब	जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार, पुनर्जीवन, पुनर्भरण इत्यादि जैसे - लघु तालाब व माईनर नहरों का रखरखाव, जल पुनर्भरण, तालाबों का गहरीकरण व जीर्णोद्धार (गाद निकालने सहित)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सागर	10049	992	842	8355	472	641	172.19	2.32	6.23
2	छतरपुर	14783	2427	210	11752	748	170	206.15	1.72	10.50
3	दमोह	10942	566	1098	9209	554	816	145.34	5.26	32.31
4	टीकमगढ़	9434	877	525	8110	872	466	127.76	1.30	12.18
5	पन्ना	8201	0	710	7479	0	384	120.63	0.00	14.12
6	दतिया	1220	0	225	546	0	82	5.44	0.00	0.23
महायोग		53727	4862	3610	45451	2646	2559	777.52	10.60	75.57
कुल व्यय राशि (करोड़ में)									863.69	

बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज अंतर्गत व्यय का विवरण पम्पसेट एवं स्टापडेम (प्रथम चरण)

माह मार्च 2016 की स्थिति में

क्रमांक	जिले का नाम	वित्तीय लक्ष्य (रु. करोड़ में)			जिले को प्रदाय राशि (रु. करोड़ में)			व्यय राशि (रु. करोड़ में)			लक्ष्य v/s व्यय का प्रतिशत		
		पम्पसेट	स्टापडेम	योग	पम्पसेट	स्टापडेम	योग	पम्पसेट	स्टापडेम	योग	पम्पसेट	स्टापडेम	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	सागर	13.14	40.17	53.31	13.14	40.17	53.31	13.14	34.40	47.54	100%	86%	89%
2	छतरपुर	18.16	24.27	42.43	18.16	24.27	42.43	18.13	21.62	39.75	100%	89%	94%
3	दमोह	16.45	18.55	35.00	16.45	18.55	35.00	16.32	17.09	33.41	99%	92%	95%
4	टीकमगढ़	17.51	20.88	38.39	17.51	20.88	38.39	16.12	17.81	33.93	92%	85%	88%
5	पन्ना	13.95	15.78	29.73	13.95	15.78	29.73	13.38	12.47	25.85	96%	79%	87%
6	दतिया	0.80	10.35	11.15	0.80	10.35	11.15	0.78	9.89	10.67	98%	96%	96%
योग		80.00	130.00	210.00	80.00	130.00	210.00	77.88	113.28	191.16	97%	87%	91%

क्र.	आबंटन	जारी राशि	व्यय राशि	व्यय का प्रतिशत
1.	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से प्राप्त कुल राशि	210.000	191.16	91%
2.	राज्य सरकार की ओर से जारी राशि	0	-	-
	कुल प्रदाय राशि	210.000	191.16	91%

**Allocation, Released and Expenditure of funds from ACA,CS/CSS, MGNREGA
components to MP (March 2016) (Rs. In Cr.) II Phase**

S N.	Department	Approved Budget	Additional central Assistance			CS/CSS Schemes			MGNREGA			UC
			Alloca tion	Relea sed	Actual	Allocation	Released	Actual	Allocation	Released	Actual	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Rural development											
i)	Supply of pump sets	25.00	25.00	4.15	6.60							6.13
	Total	25.00	25.00	4.15	6.60							6.13

Note :- Because second installment is not received, hence the interest earned in the head of Bundelkhand Special Package is used.

Bundelkhand special package financial progress up to March 2016

Name of Department

Rural Development

phase I, 2012-13

Sl.no.	Name of project/scheme	Total Project cost	Approved ACA	Allocation	Released Up to March 2016	Expenditure till March 2016	% of Expenditure	UC sent to GoI till March 2016
1	Stop dam	130	130	130	130	113.28	87%	109.69
2	Supply of Pump sets	80.00	80.00	80.00	80.00	77.88	97%	76.59

phase I, 2013-14

Sl.no.	Name of project/scheme	Total Project cost	Approved ACA	Allocation	Released Up to March 2016	Expenditure till March 2016	% of Expenditure	UC sent to GoI till March 2016
1	-	-	-	-	-	-	-	-

phase II, 2013-14

Sl.no.	Name of project/scheme	Total Project cost	Approved ACA	Allocation	Released Up to March 2016	Expenditure till March 2016	% of Expenditure	UC sent to GoI till March 2016
1	Supply of Pump sets	25.00	25.00	25.00	4.15	6.60	159%	6.13

ACA- Phase -1 2012-13 (As on 31.03. 2016) (Rs. In Cr.)			
Department	Allocation	Released	Expenditure
Rural development (Stop dam & pump set)	210.00	210.00	191.16
ACA- Phase -I 2013-14 (As on 31.03. 2016) (Rs. In Cr.)			
Department	Allocation	Released	Expenditure
Rural development	-	-	-
ACA- Phase -II 2014-15 (As on 31.03. 2016) (Rs. In Cr.)			
Department	Allocation	Released	Expenditure
Rural development (Stop dam & pump set)	25	4.15	6.60

**Financial & Physical Targets and Achievement as on March 2016 (MGNREGA)
(First phase)**

S.No.	Scheme/District	Financial (Rs. In Cr.)		Physical (No.)	
		Target	Actual	Target	Achievement
I	Stop Dam				
1	Sagar	40.17	34.40	84	81
2	Chhatarpur	24.27	21.62	86	86
3	Damoh	18.55	17.09	53	53
4	Tikamgarh	20.88	17.81	67	63
5	Panna	15.78	12.47	35	34
6	Datia	10.35	9.89	28	27
Total		130.00	113.28	353	344
II	Pump Sets / Lifting Device				
1	Sagar	13.14	13.14	6568	6568
2	Chhatarpur	18.16	18.13	9081	9081
3	Damoh	16.45	16.32	8223	8223
4	Tikamgarh	17.51	16.12	8754	8062
5	Panna	13.95	13.38	6974	6403
6	Datia	0.80	0.78	400	400
Total		80.00	77.88	40000	38737
III	Dug Wells				
1	Sagar	209.81	172.19	10049	8355
2	Chhatarpur	264.9	206.15	14783	11752
3	Damoh	175.13	145.34	10942	9209
4	Tikamgarh	135.17	127.76	9434	8110
5	Panna	135.95	120.63	8201	7479
6	Datia	12.15	5.44	1220	546
Total		933.11	777.52	53727	45451
IV	Khet Talab				
1	Sagar	4.77	2.32	992	472
2	Chhatarpur	5.58	1.72	2427	748
3	Damoh	5.90	5.26	566	554
4	Tikamgarh	1.38	1.30	877	872
5	Panna	0	0.00	0	0
6	Datia	0	0.00	0	0
Total		17.63	10.60	4862	2646
V	Renovation and Recharging of Dug Wells				
1	Sagar	8.20	6.23	842	641
2	Chhatarpur	12.98	10.50	210	170
3	Damoh	43.48	32.31	1098	816
4	Tikamgarh	13.72	12.18	525	466
5	Panna	26.10	14.12	710	384
6	Datia	0.63	0.23	225	82
Total		105.11	75.57	3610	2559

**Financial & Physical Targets and Achievement as on March 2016 (MGNREGA)
(Second phase)**

S.No.	Scheme/District	Financial (Rs. In Cr.)		Physical (No.)	
		Target	Actual	Target	Achievement
II	Pump Sets / Lifting Device				
1	Sagar	3.54	1.93	1417	1047
2	Chhatarpur	7.05	3.40	2820	1232
3	Damoh	4.77	1.22	1906	506
4	Tikamgarh	4.85	0.00	1939	0
5	Panna	4.05	0.00	1618	0
6	Datia	0.75	0.05	300	0
	Total	25.00	6.60	10000	2785

M
AL

**PHYSICAL TARGETS & ACHIVEMENT UNDER BUNDELKHAND SPECIAL PACKAGE AS
ON March 2016 (MGNREGA)**

STOP DAM (FIRST PHASE)					
S.No.	Scheme/District	Target	Completed	Ongoing	Remark
1	Sagar	84	81	3	
2	Chhatarpur	86	86	0	
3	Damoh	53	53	0	
4	Tikamgarh	67	63	2	02 Stop dams cancelled
5	Panna	35	34	1	
6	Datia	28	27	0	01 Stop dam cancelled
	Total	353	344	6	
PUMP SETS / LIFTING DEVICE (FIRST PHASE)					
S.No.	Scheme/District	Target	IDENTIFIED BENIFICIERIS	PUMP INSTALLED	Remark
1	Sagar	6568	6568	6568	
2	Chhatarpur	9081	9081	9081	
3	Damoh	8223	8223	8223	
4	Tikamgarh	8754	8062	8062	
5	Panna	6974	6974	6403	
6	Datia	400	400	400	
	Total	40000	39308	38737	
PUMP SETS / LIFTING DEVICE (SECOND PHASE)					
S.No.	Scheme/District	Target	IDENTIFIED BENIFICIERIS	PUMP INSTALLED	Remark
1	Sagar	1417	1417	1047	process of installing pump sets is on progress
2	Chhatarpur	2820	1327	1232	
3	Damoh	1906	663	506	
4	Tikamgarh	1939	0	0	
5	Panna	1618	0	0	
6	Datia	300	75	0	
	Total	10000	3482	2785	

M. A. E.
AE
