


बुन्देलखण्ड पैकेज

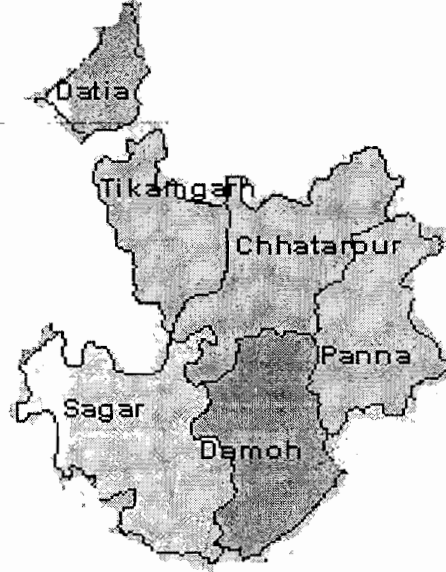

विद्युत/डीजल पम्प सेट प्रदाय एवं स्टाप डेम निर्माण की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

माह दिसम्बर 2014

बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज प्रथम चरण

कपिल धारा कूओं पर विद्युत/डीजल पम्प प्रदाय

- ✓ कुल प्रावधानित राशि रू. 80 करोड़
- ✓ जिलों को प्रदाय राशि रू. 80 करोड़
- ✓ भौतिक लक्ष्य संख्या – 40,000
- ✓ पूर्ण कूपों की संख्या – **42181** (महात्मा गांधी नरेगा कपिलधारा उपयोजनान्तर्गत)
- ✓ पम्पसेट प्रदाय हेतु चिन्हित हितग्राहियों की संख्या – **39322**
- ✓ कुल स्थापित पम्पों की संख्या – **36989**
- ✓ लक्ष्य पूर्ति हेतु शेष पम्पों की संख्या –3011
- ✓ व्यय राशि रू. **71.66** करोड़

नदी नालों पर श्रंखलाबद्ध स्टाप डेम- ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विकास आयुक्त कार्यालय से प्राप्त जानकारी के आधार पर

- ✓ कुल प्रावधानित राशि रू. 130 करोड़
- ✓ जिलों को प्रदाय राशि रू 130 करोड़
- ✓ स्टाप डेम की संख्या – 353
- ✓ पूर्ण स्टाप डेम की संख्या – 318
- ✓ प्रगतिरत स्टाप डेम की संख्या-33 (9 फाऊंडेशन लेवल एवं 24 सुपर स्ट्रक्चर लेवल)
- ✓ अप्रारंभ स्टाप डेम की संख्या- 02 (टीकमगढ जिले के 02 अप्रारंभ स्टापडेम निरस्त किये जा चुके हैं),
- ✓ कुल व्यय राशि रू. 102.36 करोड़

पम्पसेट प्रदाय एवं स्टापडेम निर्माण की अद्यतन वित्तीय प्रगति

क्र	विवरण	स्वीकृत राशि	ACA से प्राप्त (राशि करोड में)			जिलों को प्रदाय राशि	व्यय	प्रतिशत	उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
			I	II	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पम्प सेट प्रदाय	80.00	45.00	35.00	80.00	80.00	71.66	90%	66.77
2	स्टापडेम निर्माण	130.00	26.40	103.60	130.00	130.00	102.36	79%	94.34
	योग	210.00	71.40	138.60	210.00	210.00	174.02	83%	161.11

बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज द्वितीय चरण

(वर्ष 2013-14 से वर्ष 2016-17 तक)

कपिल धारा कूओं पर विद्युत/डीजल पम्प प्रदाय

- ✓ कुल प्रावधानित राशि — रू. 25.00 करोड़
- ✓ प्राप्त राशि — रू. 4.15 करोड़
- ✓ जिलों को प्रदाय राशि — रू. 4.15 करोड़
- ✓ भौतिक लक्ष्य संख्या — 10,000
- ✓ पम्पसेट प्रदाय हेतु चिन्हित हितग्राहियों की संख्या — 2266
- ✓ कुल स्थापित पम्पों की संख्या — 0
- ✓ व्यय राशि — निरंक

द्वितीय चरण हेतु पम्पसेट प्रदाय की अद्यतन वित्तीय प्रगति

क्र.	विवरण	स्वीकृत राशि	ACA से प्राप्त (राशि करोड़ में)			जिलों को प्रदाय राशि	व्यय	प्रतिशत	उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
			I	II	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पम्प सेट प्रदाय	25.00	4.15	0	4.15	4.15	0	0%	0

नोट :- सागर, दमोह, छतरपुर एवं दतिया जिलों में प्रथम चरण की लक्ष्य पूर्ति की जा चुकी है, अतः वहां द्वितीय चरण के विद्युत/डीजल पम्प सेट प्रदाय की कार्यवाही प्रारंभ कर कुल 2266 हितग्राहियों को पम्प सेट प्रदाय करने हेतु चिन्हांकित कर लिया गया है। पन्ना एवं टीकमगढ़ जिले में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार मनरेगा के सफल कूप उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण द्वितीय चरण हेतु कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई है।

Financial & Physical Targets and Achievement as on December 2014 (MGNREGA) (First phase)					
S.No.	Scheme/District	Financial (Rs. In Cr.)		Physical (No.)	
		Target	Actual	Target	Achievement
I	Stop Dam				
1	Sagar	40.17	29.70	84	73
2	Chhatarpur	24.27	20.14	86	81
3	Damoh	18.55	16.68	53	53
4	Tikamgarh	20.88	15.56	67	60
5	Panna	15.78	11.93	35	30
6	Datia	10.35	8.35	28	21
	Total	130.00	102.36	353.00	318
II	Pump Sets / Lifting Device				
1	Sagar	13.14	12.12	6568	6470
2	Chhatarpur	18.16	16.86	9081	9081
3	Damoh	16.45	15.63	8223	8223
4	Tikamgarh	17.51	14.82	8754	7408
5	Panna	13.95	11.65	6974	5499
6	Datia	0.80	0.58	400	308
	Total	80.00	71.66	40000	36989
III	Dug Wells				
1	Sagar		140.93		7638
2	Chhatarpur		198.25		11014
3	Damoh		137.01		8677
4	Tikamgarh		120.30		7612
5	Panna		113.64		6722
6	Datia		5.24		518
	Total		715.38		42181
IV	Khet Talab				
1	Sagar		2.27	992	472
2	Chhatarpur		1.72	2427	748
3	Damoh		1.76	566	185
4	Tikamgarh		1.30	877	872
5	Panna		0.00	0	0
6	Datia		0.00	0	0
	Total		7.05	4862	2277
V	Renovation and Recharging of Dug Wells				
1	Sagar		6.21	842	641
2	Chhatarpur		10.50	210	170
3	Damoh		20.16	1098	509
4	Tikamgarh		12.18	525	466
5	Panna		14.12	710	384
6	Datia		0.23	225	82
	Total		63.40	3610	2252

बुन्देलखण्ड पैकेज अंतर्गत

ACA मद से

पम्प सेट प्रदाय की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति (प्रथम चरण)

माह दिसम्बर 2014 की स्थिति में

प्रपत्र 01

क्रमांक	जिले का नाम	भौतिक प्रगति						वित्तीय प्रगति			
		भौतिक लक्ष्य	चिह्नित हितग्राही	पम्प प्रतिस्थापना हेतु जारी आदेश (हितग्राहियों की संख्या)	स्थापित पंपों की संख्या	लक्ष्य पूर्ति हेतु शेष पंपों की संख्या	वित्तीय लक्ष्य (रु.करोड़ में)	जिले को प्रदाय राशि (रु.करोड़ में)	पम्प सेट हेतु विमुक्त अनुदान की राशि (रु. करोड़ में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	सागर	6568	6568	6568	6470	98	13.1360	13.1360	12.1193		
2	छतरपुर	9081	9081	9081	9081	0	18.1620	18.1620	16.8628		
3	दमोह	8223	8223	8223	8223	0	16.4460	16.4460	15.6313		
4	टीकमगढ़	8754	8354	7408	7408	1346	17.5080	17.5080	14.8160		
5	पन्ना	6974	6696	6696	5499	1475	13.9480	13.9480	11.6476		
6	दतिया	400	400	389	308	92	0.8000	0.8000	0.5819		
	योग	40000	39322	38365	36989	3011	80.00	80.0000	71.6589		

प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल
बुन्देलखण्ड पैकेज अंतर्गत ACA मद से स्टापडेम निर्माण की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति (प्रथम चरण)
माह दिसम्बर 2014 की स्थिति में प्रपत्र - 02

क्र.	जिला	वित्तीय प्रगति				भौतिक प्रगति						
		वित्तीय लक्ष्य (रु.करोड़)	जिले को प्रदाय राशि (रु.करोड़)	व्यय राशि (रु.करोड़)	भौतिक लक्ष्य	स्वीकृत कार्यों की संख्या	प्रगतिरत कार्यों की संख्या	पूर्ण कार्यों की संख्या	अप्रारंभ कार्यों की संख्या	प्रगतिरत कार्य		योग
										फाऊं.डेशन लेवल	सुपर स्ट्रक्चर लेवल	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	सागर	40.17	40.17	29.70	84	84	11	73	0	6	5	11
2	छतरपुर	24.27	24.27	20.14	86	86	5	81	0	0	5	5
3	दमोह	18.55	18.55	16.68	53	53	0	53	0	0	0	0
4	टीकमगढ़	20.88	20.88	15.56	67	67	5	60	2	1	4	5
5	पन्ना	15.78	15.78	11.93	35	35	5	30	0	0	5	5
6	दतिया	10.35	10.35	8.35	28	28	7	21	0	2	5	7
	महायोग	130.00	130.00	102.36	353	353	33	318	2	9	24	33

नोट - टीकमगढ़ जिले के 02 कार्य निरस्त किये गये हैं। सागर जिले में 02 कार्य डूब क्षेत्र अंतर्गत हैं।

**बुन्देलखण्ड पैकेज अंतर्गत
ACA मद से
पम्प सेट प्रदाय की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति (द्वितीय चरण)**

माह दिसम्बर 2014 की स्थिति में

प्रपत्र - 03

क्रमांक	जिले का नाम	भौतिक प्रगति				वित्तीय प्रगति			
		भौतिक लक्ष्य	चिह्नित हितग्राही	स्थापित पंपों की संख्या	लक्ष्य पूर्ति हेतु शेष पंपों की संख्या	वित्तीय लक्ष्य (रु. करोड़ में)	जिले को प्रदाय राशि (रु. करोड़ में)	पम्प सेट हेतु विमुक्त अनुदान की राशि (रु. करोड़ में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	सागर	1417	1070	0	1417	3.5425	0.7500	0.00	
2	छतरपुर	2820	676	0	2820	7.0500	1.0900	0.00	
3	दमोह	1906	454	0	1906	4.7650	0.7500	0.00	
4	टीकमगढ़	1939	0	0	1939	4.8475	0.7950	0.00	
5	पन्ना	1618	0	0	1618	4.0450	0.7125	0.00	
6	दतिया	300	66	0	300	0.7500	0.0525	0.00	
	योग	10000	2266	0	10000	25.0000	4.1500	0.00	

नोट :- प्रथम चरण के लक्ष्य पूर्ति के उपरांत ही द्वितीय चरण हेतु पम्प सेट प्रदाय करने की कार्यवाही की जाना है। टीकमगढ़ एवं पन्ना जिले में अभी प्रथम चरण हेतु निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति नहीं हुई है। अतः द्वितीय चरण हेतु पम्प प्रदाय किये जाने की कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकी है। दमोह एवं छतरपुर जिलों में प्रथम चरण के लक्ष्य पूर्ति हो गई है, अतः द्वितीय चरण हेतु कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

MGNREGS अंतर्गत सम्पन्न कार्य (प्रथम चरण)

क्र.	जिले का नाम	स्वीकृत कार्यों का विवरण			पूर्ण कार्यों का विवरण				पूर्ण कार्यों पर व्यय राशि (करोड़ में)		
		कुँआ	खेत तालाब	जल संवर्द्धन के कार्य	कुँआ	खेत तालाब	कुँआ	खेत तालाब			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	सागर	9996	992	842	7638	472	641	140.93	2.27	6.21	
2	छतरपुर	14717	2427	210	11014	748	170	198.25	1.72	10.50	
3	दमोह	13073	566	1098	8677	185	509	137.01	1.76	20.16	
4	टीकमगढ़	8654	877	525	7612	872	466	120.30	1.30	12.18	
5	पन्ना	8303	0	710	6722	0	384	113.64	0.00	14.12	
6	दतिया	1220	0	225	518	0	82	5.24	0.00	0.23	
महायोग		55963	4862	3610	42181	2277	2252	715.38	7.05	63.40	
									कुल व्यय राशि (करोड़ में)		785.83

बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज अंतर्गत व्यय का विवरण पम्पसेट एवं स्टापडेम (प्रथम चरण)

माह दिसम्बर 2014 की स्थिति में

क्रमांक	जिले का नाम	वित्तीय लक्ष्य (रु. करोड़ में)			जिले को प्रदाय राशि (रु. करोड़ में)			व्यय राशि (रु. करोड़ में)			लक्ष्य v/s व्यय का प्रतिशत		
		पम्पसेट	स्टापडेम	योग	पम्पसेट	स्टापडेम	योग	पम्पसेट	स्टापडेम	योग	पम्पसेट	स्टापडेम	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	सागर	13.1360	40.1700	53.3060	13.1360	40.1700	53.3060	12.12	29.70	41.82	92%	74%	78%
2	छतरपुर	18.1620	24.2700	42.4320	18.1620	24.2700	42.4320	16.86	20.14	37.00	93%	83%	87%
3	दमोह	16.4460	18.5500	34.9960	16.4460	18.5500	34.9960	15.63	16.68	32.31	95%	90%	92%
4	टीकमागढ़	17.5080	20.8800	38.3880	17.5080	20.8800	38.3880	14.82	15.56	30.38	85%	75%	79%
5	पन्ना	13.9480	15.7800	29.7280	13.9480	15.7800	29.7280	11.65	11.93	23.58	84%	76%	79%
6	दतिया	0.8000	10.3500	11.1500	0.8000	10.3500	11.1500	0.58	8.35	8.93	73%	81%	80%
	योग	80.0000	130.0000	210.0000	80.0000	130.0000	210.0000	71.66	102.36	174.02	90%	79%	83%

क्र.	आबंटन	जारी राशि	व्यय राशि	व्यय का प्रतिशत
1.	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से प्राप्त कुल राशि	210.0000	174.02	83%
2.	राज्य सरकार की ओर से जारी राशि	0	-	-
	कुल प्रदाय राशि:	210.0000	174.02	83%
