


बुन्देलखण्ड पैकेज

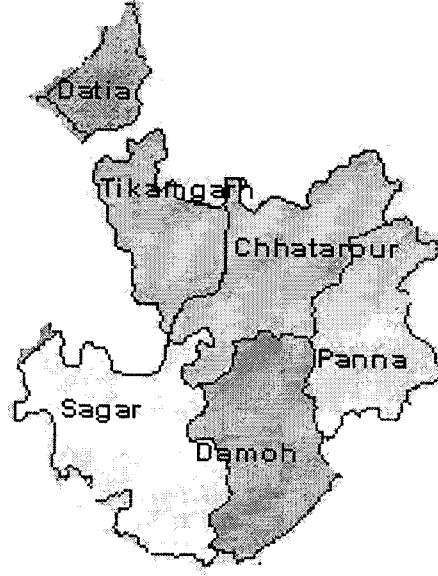

विद्युत/डीजल पम्प सेट प्रदाय एवं स्टाप डेम निर्माण की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

माह मार्च 2015

बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण (ACA मद)

कपिल धारा कूओं पर विद्युत/डीजल पम्प प्रदाय

विवरण	प्रथम चरण	द्वितीय चरण (2013-14 से 2016-17 तक)
कुल प्रावधानित राशि	रु. 80.00 करोड़	रु. 25.00 करोड़
कुल प्राप्त राशि	रु. 80.00 करोड़	रु. 4.15 करोड़
जिलों को प्रदाय राशि	रु. 80.00 करोड़	रु. 4.15 करोड़
व्यय राशि	रु. 74.91 करोड़	रु. 4.28 करोड़
भौतिक लक्ष्य संख्या	40,000	10,000
पम्पसेट प्रदाय हेतु चिन्हित हितग्राहियों की संख्या	38,843	2,715
पम्पसेट प्रदाय हेतु जारी कार्यादेश की संख्या	38,770	2577
कुल स्थापित पम्पों की संख्या	37,767	758

नदी नालों पर श्रंखलाबद्ध स्टाप डेम- ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विकास आयुक्त कार्यालय से प्राप्त जानकारी के आधार पर

- ✓ कुल प्रावधानित राशि रु. 130 करोड़
- ✓ जिलों को प्रदाय राशि रु 130 करोड़
- ✓ स्टाप डेम की संख्या - 353
- ✓ पूर्ण स्टाप डेम की संख्या - 325
- ✓ प्रगतिरत स्टाप डेम की संख्या-26 (6 फाऊंडेशन लेवल एवं 20 सुपर स्ट्रकचर लेवल)
- ✓ अप्रारंभ स्टाप डेम की संख्या- 02 (टीकमगढ जिले के 02 अप्रारंभ स्टापडेम निरस्त किये जा चुके हैं)
- ✓ कुल व्यय राशि रु. 104.08 करोड़

प्रथम चरण

पम्पसेट प्रदाय एवं स्टापडेम निर्माण की अद्यतन वित्तीय प्रगति (राशि करोड में)

क्र	विवरण	स्वीकृत राशि	ACA से प्राप्त			जिलों को प्रदाय राशि	व्यय	प्रतिशत	उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
			I	II	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पम्प सेट प्रदाय	80.00	45.00	35.00	80.00	80.00	74.91	94 %	73.27
2	स्टापडेम निर्माण	130.00	26.40	103.60	130.00	130.00	104.08	80%	101.28
	योग	210.00	71.40	138.60	210.00	210.00	178.99	85%	174.55

द्वितीय चरण

पम्पसेट प्रदाय की अद्यतन वित्तीय प्रगति (राशि करोड में)

क्र	विवरण	स्वीकृत राशि	ACA से प्राप्त राशि			जिलों को प्रदाय राशि	व्यय	प्रतिशत	उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
			I	II	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पम्प सेट प्रदाय	25.00	4.15	0	4.15	4.15	4.28	103 %	1.19

**बुन्देलखण्ड पैकेज अंतर्गत
ACA मद से
पम्प सेट प्रदाय की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति (प्रथम चरण)**

माह 31 मार्च 2015 की स्थिति में प्रपत्र 01

क्रमांक	जिले का नाम	भौतिक प्रगति					वित्तीय प्रगति			
		भौतिक लक्ष्य	विहित हितग्राही	पम्प प्रतिस्थापना हेतु जारी आदेश (हितग्राहियों की संख्या)	स्थापित पंपों की संख्या	लक्ष्य पूर्ति हेतु शेष पंपों की संख्या	वित्तीय लक्ष्य (रु. करोड़ में)	जिले को प्रदाय राशि (रु. करोड़ में)	पम्प सेट हेतु विमुक्त अनुदान की राशि (रु. करोड़ में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	सागर	6568	6568	6568	6568	0	13.1360	13.1360	13.1360	
2	छतरपुर	9081	9081	9081	9081	0	18.1620	18.1620	17.7529	
3	दमोह	8223	8223	8223	8223	0	16.4460	16.4460	16.0722	
4	टीकमगढ़	8754	7875	7802	7802	952	17.5080	17.5080	15.6040	
5	पन्ना	6974	6696	6696	5693	1281	13.9480	13.9480	11.6476	
6	दतिया	400	400	400	400	64	0.8000	0.8000	0.6923	
	योग	40000	38843	38770	37767	2297	80.0000	80.0000	74.9050	

- नोट :- 1. प्रथम चरण के लक्ष्य पूर्ति के उपरांत ही द्वितीय चरण हेतु पम्प सेट प्रदाय करने की कार्यवाही की जाना है।
2. दमोह एवं छतरपुर एवं सागर जिलों में प्रथम चरण के लक्ष्य पूर्ति उपरांत, द्वितीय चरण हेतु हितग्राही विहित करते हुए प्रथम किरत भी जारी की गई है।
3. दतिया में प्रथम चरण के लक्ष्य अनुसार पम्प प्रदाय हेतु प्रथम किरत जारी की जा चुकी है अतः द्वितीय चरण हेतु हितग्राही भी चिह्नित किये गये हैं।
4. टीकमगढ़ एवं पन्ना जिले में अभी प्रथम चरण हेतु निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति नहीं हुई है। अतः द्वितीय चरण हेतु पम्प प्रदाय किये जाने की कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकी है।
5. टीकमगढ़ जिले में चिह्नित हितग्राहियों की संख्या पूर्व में 8354 प्रेषित की गई थी, किन्तु भौतिक सत्यापन में विसंगति पाये जाने पर माह मार्च में यह संख्या 7875 दर्शाई गई है।

प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल
बुन्देलखण्ड पैकेज अंतर्गत ACA मद से स्टापडेम निर्माण की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति (प्रथम चरण)
माह 31 मार्च 2015 की स्थिति में

प्रपत्र - 02

क्र.	जिला	वित्तीय प्रगति				भौतिक प्रगति						
		वित्तीय लक्ष्य (रु. करोड़)	जिले को प्रदाय राशि (रु. करोड़)	व्यय राशि (रु. करोड़)	भौतिक लक्ष्य	स्वीकृत कार्यों की संख्या	प्रगतिरत कार्यों की संख्या	पूर्ण कार्यों की संख्या	अप्रारंभ कार्यों की संख्या	प्रगति कार्य		योग
										फाऊंडेशन लेवल	सुपर स्ट्रक्चर लेवल	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	सागर	40.17	40.17	30.53	84	84	8	76	0	3	5	8
2	छतरपुर	24.27	24.27	20.20	86	86	4	82	0	0	4	4
3	दमोह	18.55	18.55	16.68	53	53	0	53	0	0	0	0
4	टीकमगढ़	20.88	20.88	15.90	67	67	5	60	2	1	4	5
5	पन्ना	15.78	15.78	11.93	35	35	5	30	0	0	5	5
6	दतिया	10.35	10.35	8.84	28	28	4	24	0	2	2	4
	महायोग	130.00	130.00	104.08	353	353	26	325	2	6	20	26

नोट - टीकमगढ़ जिले के 02 कार्य निरस्त किये गये हैं। सागर जिले में 02 कार्य डूब क्षेत्र अंतर्गत हैं।

बुन्देलखण्ड पैकेज अंतर्गत

ACA मद से

पम्प सेट प्रदाय की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति (द्वितीय चरण)

माह 31 मार्च 2015 की स्थिति में

प्रपत्र - 03

क्रमांक	जिले का नाम	भौतिक प्रगति					वित्तीय प्रगति			
		भौतिक लक्ष्य	चिह्नित हितग्राही	ऐसे हितग्राहियों की संख्या जिनके लिए प्रथम किश्त हेतु 60 % की राशि जारी की गई	स्थापित पंपों की संख्या	लक्ष्य पूर्ति हेतु शेष पंपों की संख्या	वित्तीय लक्ष्य (रु.करोड़ में)	जिले को प्रदाय राशि (रु.करोड़ में)	पम्प सेट हेतु विमुक्त अनुदान की राशि (रु.करोड़ में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	सागर	1417	1070	1030	100	1317	3.5425	1.5450	1.5450	
2	छतरपुर	2820	1049	1041	598	2222	7.0500	1.8025	1.9770	
3	दमोह	1906	530	506	60	1846	4.7650	0.7500	0.7590	
4	टीकमगढ़	1939	0	0	0	1939	4.8475	0.0000	0.0000	
5	पन्ना	1618	0	0	0	1618	4.0450	0.0000	0.0000	
6	दतिया	300	66	0	0	300	0.7500	0.0525	0.0000	
	योग	10000	2715	2577	758	9242	25.0000	4.1500	4.2810	

नोट :- 1. प्रथम चरण के लक्ष्य पूर्ति के उपरांत ही द्वितीय चरण हेतु पम्प सेट प्रदाय करने की कार्यवाही की जाना है।

2. दमोह एवं छतरपुर एवं सागर जिलों में प्रथम चरण के लक्ष्य पूर्ति उपरांत, द्वितीय चरण हेतु हितग्राही चिह्नित करते हुए प्रथम किश्त भी जारी की गई है।

3. दतिया में प्रथम चरण के लक्ष्य अनुसार पम्प प्रदाय हेतु प्रथम किश्त जारी की जा चुकी है अतः द्वितीय चरण हेतु हितग्राही भी चिह्नित किये गये हैं।

4. टीकमगढ़ एवं पन्ना जिले में अभी प्रथम चरण हेतु निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति नहीं हुई है। अतः द्वितीय चरण हेतु पम्प प्रदाय किये जाने की कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकी है।

MGNREGS अंतर्गत सम्पन्न कार्य (प्रथम चरण)

माह 31 मार्च 2015 की स्थिति में

प्रपत्र -04

क्र.	जिले का नाम	स्वीकृत कार्यों का विवरण			पूर्ण कार्यों का विवरण				कुल व्यय राशि (करोड़ में)	
		कुँआ	खेत तालाब	जल संवर्द्धन के कार्य	पूर्ण कार्यों की संख्या		पूर्ण कार्यों पर व्यय राशि (करोड़ में)			
					कुँआ	खेत तालाब	जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार, पुनर्जीवन, पुनर्भरण इत्यादि जैसे - लघु तालाब व माईनर नहरों का रखरखाव, जल पुनर्भरण, तालाबों का गहरीकरण व जीर्णोद्धार (गाद निकालने सहित)।	कुँआ		खेत तालाब
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सागर	9996	992	842	7779	472	641	163.28	2.27	6.21
2	छतरपुर	14717	2427	210	11453	748	170	206.15	1.72	10.50
3	दमोह	10942	566	1098	8721	185	509	137.01	1.76	20.16
4	टीकमगढ़	8314	877	525	7875	872	466	124.66	1.30	12.18
5	पन्ना	8201	0	710	7172	0	384	118.90	0.00	14.12
6	दतिया	1220	0	225	546	0	82	5.44	0.00	0.23
महायोग		53390	4862	3610	43546	2277	2252	755.45	7.05	63.40
कुल व्यय राशि (करोड़ में)										825.91

बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज अंतर्गत व्यय का विवरण पम्पसेट एवं स्टापडेम (प्रथम चरण)

माह 31 मार्च 2015 की स्थिति में

क्रमांक	जिले का नाम	वित्तीय लक्ष्य (रु. करोड़ में)			जिले को प्रदाय राशि (रु. करोड़ में)			व्यय राशि (रु. करोड़ में)			लक्ष्य v/s व्यय का प्रतिशत		
		पम्पसेट	स्टापडेम	योग	पम्पसेट	स्टापडेम	योग	पम्पसेट	स्टापडेम	योग	पम्पसेट	स्टापडेम	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	सागर	13.14	40.17	53.31	13.14	40.17	53.31	13.14	30.53	43.67	100%	76%	82%
2	छतरपुर	18.16	24.27	42.43	18.16	24.27	42.43	17.75	20.20	37.95	98%	83%	89%
3	दमोह	16.45	18.55	35.00	16.45	18.55	35.00	16.07	16.68	32.75	98%	90%	94%
4	टीकमगढ़	17.51	20.88	38.39	17.51	20.88	38.39	15.60	15.90	31.50	89%	76%	82%
5	पन्ना	13.95	15.78	29.73	13.95	15.78	29.73	11.65	11.93	23.58	84%	76%	79%
6	दतिया	0.80	10.35	11.15	0.80	10.35	11.15	0.69	8.84	9.53	87%	85%	85%
	योग	80.00	130.00	210.00	80.00	130.00	210.00	74.91	104.08	178.99	94%	80%	85%

क्र.	आबंटन	जारी राशि	व्यय राशि	व्यय का प्रतिशत
1.	अतिरिक्त केंद्रीय सहायता से प्राप्त कुल राशि	210.000	178.99	85%
2.	राज्य सरकार की ओर से जारी राशि	0	-	-
	कुल प्रदाय राशि	210.000	178.99	85%

**PHYSICAL TARGETS & ACHIVEMENT UNDER BUNDELKHAND SPECIAL PACKAGE
AS ON 31 MARCH 2015 (MGNREGA)**

STOP DAM (FIRST PHASE)					
S.No.	Scheme/District	Target	Completed	Ongoing	Remark
1	Sagar	84	76	8	
2	Chhatarpur	86	82	4	
3	Damoh	53	53	0	
4	Tikamgarh	67	60	5	02 Stop dams cancelled
5	Panna	35	30	5	
6	Datia	28	24	4	
	Total	353	325	26	
PUMP SETS / LIFTING DEVICE (FIRST PHASE)					
S.No.	Scheme/District	Target	IDENTIFIED BENIFICIERIS	PUMP INSTALLED	Remark
1	Sagar	6568	6568	6568	
2	Chhatarpur	9081	9081	9081	
3	Damoh	8223	8223	8223	
4	Tikamgarh	8754	7875	7802	
5	Panna	6974	6696	5693	
6	Datia	400	400	400	
	Total	40000	38843	37767	
PUMP SETS / LIFTING DEVICE (SECOND PHASE)					
S.No.	Scheme/District	Target	IDENTIFIED BENIFICIERIS	PUMP INSTALLED	Remark
1	Sagar	1417	1070	100	process of installing pump sets is on progress
2	Chhatarpur	2820	1049	598	
3	Damoh	1906	530	60	
4	Tikamgarh	1939	0	0	
5	Panna	1618	0	0	
6	Datia	300	66	0	
	Total	10000	2715	758	

**Financial & Physical Targets and Achievement as on 31 MARCH 2015
(MGNREGA) (First phase)**

S.No.	Scheme/District	Financial (Rs. In Cr.)		Physical (No.)	
		Target	Actual	Target	Achievement
I	Stop Dam				
1	Sagar	40.17	30.53	84	76
2	Chhatarpur	24.27	20.20	86	82
3	Damoh	18.55	16.68	53	53
4	Tikamgarh	20.88	15.90	67	60
5	Panna	15.78	11.93	35	30
6	Datia	10.35	8.84	28	24
	Total	130.00	104.08	353	325
II	Pump Sets / Lifting Device				
1	Sagar	13.14	13.14	6568	6568
2	Chhatarpur	18.16	17.75	9081	9081
3	Damoh	16.45	16.07	8223	8223
4	Tikamgarh	17.51	15.60	8754	7802
5	Panna	13.95	11.65	6974	5693
6	Datia	0.80	0.69	400	400
	Total	80.00	74.91	40000	37767
III	Dug Wells				
1	Sagar		163.28	9996	7779
2	Chhatarpur		206.15	14717	11453
3	Damoh		137.01	10942	8721
4	Tikamgarh		124.66	8314	7875
5	Panna		118.90	8201	7172
6	Datia		5.44	1220	546
	Total		755.45	53390	43546
IV	Khet Talab				
1	Sagar		2.27	992	472
2	Chhatarpur		1.72	2427	748
3	Damoh		1.76	566	185
4	Tikamgarh		1.30	877	872
5	Panna		0.00	0	0
6	Datia		0.00	0	0
	Total		7.05	4862	2277
V	Renovation and Recharging of Dug Wells				
1	Sagar		6.21	842	641
2	Chhatarpur		10.50	210	170
3	Damoh		20.16	1098	509
4	Tikamgarh		12.18	525	466
5	Panna		14.12	710	384
6	Datia		0.23	225	82
	Total		63.40	3610	2252

**Financial & Physical Targets and Achievement as on 31 March 2015 (MGNREGA)
(Second phase)**

S.No.	Scheme/District	Financial (Rs. In Cr.)		Physical (No.)	
		Target	Actual	Target	Achievement
II	Pump Sets / Lifting Device				
1	Sagar	3.54	1.55	1417	100
2	Chhatarpur	7.05	1.98	2820	598
3	Damoh	4.77	0.76	1906	60
4	Tikamgarh	4.85	0.00	1939	0
5	Panna	4.05	0.00	1618	0
6	Datia	0.75	0.00	300	0
	Total	25.00	4.28	10000	758

Note - 2715 beneficiaries are selected to provide pump-sets, out of which for 2577 pump-sets, first installment (60%) has been released & 758 Pump sets installed.
