


बुन्देलखण्ड पैकेज

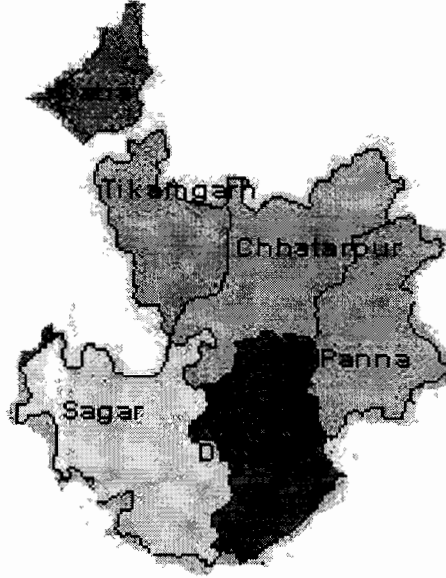

विद्युत/डीजल पम्प सेट प्रदाय एवं स्टाप डेम निर्माण की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

माह जून 2014

बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज प्रथम चरण

कपिल धारा कूओं पर विद्युत/डीजल पम्प प्रदाय

- ✓ कुल प्रावधानित राशि रू. 80 करोड़
- ✓ जिलों को प्रदाय राशि रू. 80 करोड़
- ✓ भौतिक लक्ष्य संख्या – 40,000
- ✓ पूर्ण कूपों की संख्या – 39957 (महात्मा गांधी नरेगा कपिलधारा उपयोजनान्तर्गत)
- ✓ कुल स्थापित पम्पों की संख्या – 33883
- ✓ पम्पसेट प्रदाय हेतु चिन्हित हितग्राहियों की संख्या – 37030
- ✓ व्यय राशि रू. 65.29 करोड़

नदी नालों पर श्रंखलाबद्ध स्टाप डेम- ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विकास आयुक्त कार्यालय से प्राप्त जानकारी के आधार पर

- ✓ कुल प्रावधानित राशि रू. 130 करोड़
- ✓ जिलों को प्रदाय राशि रू 130 करोड़
- ✓ स्टाप डेम की संख्या – 353
- ✓ पूर्ण स्टाप डेम की संख्या – 312
- ✓ प्रगतिरत स्टाप डेम की संख्या-39 (12 फाऊंडेशन लेवल एवं 27 सुपर स्ट्रक्चर लेवल)
- ✓ अप्रारंभ स्टाप डेम की संख्या- 02 (टीकमगढ जिले के 02 अप्रारंभ स्टापडेम निरस्त किये जा चुके हैं),
- ✓ कुल व्यय राशि रू. 90.52 करोड़

पम्पसेट प्रदाय एवं स्टापडेम निर्माण की अद्यतन वित्तीय प्रगति

क्र	विवरण	स्वीकृत राशि	ACA से प्राप्त (राशि करोड़ में)			जिलों को प्रदाय राशि	व्यय	प्रतिशत	उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
			I	II	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पम्प सेट प्रदाय	80.00	45.00	35.00	80.00	080.00	65.29	82%	62.73
2	स्टापडेम निर्माण	130.00	26.40	103.60	130.00	130.00	90.52	70%	82.32
	योग	210.00	71.40	138.60	210.00	210.00	155.81	74%	145.05

बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज द्वितीय चरण

बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज फेस -2 (वर्ष 2013-14 से वर्ष 2016-17 तक) अंतर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ACA) की राशि के अभिसरण से विद्युत/डीजल पम्प सेट प्रदाय हेतु जिलेवार भौतिक लक्ष्य एवं वित्तीय लक्ष्य निम्नानुसार निर्धारित किया गया है। प्रथम किश्त के रूप में राशि रू. 4.15 करोड़ प्राप्त हुई है। प्रथम चरण की लक्ष्य पूर्ति उपरांत ही द्वितीय चरण के विद्युत/डीजल पम्प सेट प्रदाय की कार्यवाही प्रारंभ की जावेगी।

क्रमांक	जिले का नाम	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (करोड में)
1	2	3	4
1	सागर	1417	3.5425
2	छतरपुर	2820	7.0500
3	दमोह	1906	4.7650
4	टीकमगढ	1939	4.8475
5	पन्ना	1618	4.0450
6	दतिया	300	0.7500
	योग	10000	25.0000

Financial & Physical Targets and Achievement as on JUN 2014 (MGNREGA)

S.No.	Scheme/District	Financial (Rs. In Cr.)		Physical (No.)	
		Target	Actual	Target	Achievement
I	Stop Dam				
1	Sagar	40.17	26.95	84	73
2	Chhatarpur	24.27	16.35	86	81
3	Damoh	18.55	16.50	53	53
4	Tikamgarh	20.88	12.78	67	60
5	Panna	15.78	11.04	35	30
6	Datia	10.35	6.90	28	15
	Total	130.00	90.52	353	312
II	Pump Sets / Lifting Device				
1	Sagar	12.34	11.40	6168	6005
2	Chhatarpur	18.16	14.30	9081	7231
3	Damoh	16.45	14.89	8223	7963
4	Tikamgarh	16.71	14.65	8354	7327
5	Panna	13.95	9.47	6974	5052
6	Datia	2.40	0.58	1200	305
	Total	80.00	65.29	40000	33883
III	Dug Wells				
1	Sagar		139.64	6168	6231
2	Chhatarpur		175.16	9081	10671
3	Damoh		120.11	8223	8448
4	Tikamgarh		94.44	8354	7385
5	Panna		97.97	6974	6712
6	Datia		5.24	1200	510
	Total	0	632.56	40000	39957
IV	Khet Talab				
1	Sagar		2.27	992	472
2	Chhatarpur		1.72	2427	748
3	Damoh		1.76	566	185
4	Tikamgarh		1.30	877	872
5	Panna		0.00	0	0
6	Datia		0.00	0	0
	Total	0	7.05	4862	2277
V	Renovation and Recharging of Dug Wells				
1	Sagar		6.21	842	641
2	Chhatarpur		10.50	210	170
3	Damoh		20.16	1098	509
4	Tikamgarh		12.18	525	466
5	Panna		14.12	710	384
6	Datia		0.23	225	82
	Total	0	63.40	3610	2252

बुन्देलखण्ड पैकेज अंतर्गत

ACA मद से

पम्प सेट प्रदाय की वित्तीय प्रगति

माह जून 2014 की स्थिति में

प्रपत्र - 01

क्रमांक	जिले का नाम	वित्तीय लक्ष्य (करोड़ में)	जिले को प्रदाय राशि (करोड़ में)	पम्प सेट हेतु एसीए मद से विमुक्त अनुदान की राशि (करोड़ में)
1	2	3	4	5
1	सागर	12.3360	12.336	11.40
2	छतरपुर	18.1620	18.162	14.30
3	दमोह	16.4460	16.446	14.89
4	टीकमगढ़	16.7080	16.708	14.65
5	पन्ना	13.9480	13.948	9.47
6	दतिया	2.4000	2.400	0.58
योग		80.00	80.00	65.29

बुन्देलखण्ड पैकेज अंतर्गत

ACA मद से

पम्प सेट प्रदाय की भौतिक प्रगति

माह जून 2014 की स्थिति में						
क्र.	जिले का नाम	भौतिक लक्ष्य	स्वीकृत कूप	पूर्ण कूप	कुल पम्प स्थापित	प्रपत्र - 02 चिन्हांकित हितग्राहियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	सागर	6168	9250	6231	6005	6168
2	छतरपुर	9081	14670	10671	7231	8559
3	दमोह	8223	12970	8448	7963	8448
4	टीकमगढ़	8354	9016	7385	7327	8354
5	पन्ना	6974	8303	6712	5052	5112
6	दतिया	1200	1220	510	305	389
योग		40000	55429	39957	33883	37030

प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल
 बुन्देलखण्ड पैकेज अंतर्गत ACA मद से स्टापडेम निर्माण वित्तीय प्रगति
 माह जून 2014 की स्थिति में प्रपत्र - 03

क्र.	संभाग	जिला	वित्तीय लक्ष्य राशि (करोड़ में)	जिले को प्रदाय राशि (करोड़ में)	व्यय (करोड़ में)
1	2	3	4	5	6
1	सागर	सागर	40.17	40.17	26.95
2		छतरपुर	24.27	24.27	16.35
3		दमोह	18.55	18.55	16.50
4		टीकमगढ़	20.88	20.88	12.78
5		पन्ना	15.78	15.78	11.04
		योग	119.65	119.65	83.62
6	खालियर	दतिया	10.35	10.35	6.90
		महायोग	130.00	130.00	90.52

प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल
बुन्देलखण्ड पैकेज अंतर्गत ACA मद से स्टापडेम निर्माण की भौतिक प्रगति

माह जून 2014 की स्थिति में

प्रपत्र - 04

क्र.	संभाग	जिला	भौतिक लक्ष्य	स्वीकृत कार्यों की संख्या	प्रगतिरत कार्यों की संख्या	पूर्ण कार्यों की संख्या	भौतिक प्रगति		
							अप्रारंभ	फाऊंडेशन लेवल	सुपर स्ट्रक्चर लेवल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सागर	सागर	84	84	11	73	0	7	4
2		छतरपुर	86	86	5	31	0	0	5
3	टीकमगढ़	दमोह	53	53	0	53	0	0	0
4		टीकमगढ़	67	67	5	60	2	1	4
5		पन्ना	35	35	5	30	0	0	5
		योग	325	325	26	297	2	8	18
6	ग्वालियर	दतिया	28	28	13	15	0	4	9
		महायोग	353	353	39	312	2	12	27

नोट - टीकमगढ़ जिले के 02 कार्य निरस्त किये गये हैं।

MGNREGS अंतर्गत सम्पन्न कार्य

माह जून 2014 की स्थिति में

प्रपत्र -05

क्र.	जिले का नाम	स्वीकृत कार्यों का विवरण				पूर्ण कार्यों का विवरण				
		कुँआ	खेत तालाब	जल संवर्द्धन के कार्य	पूर्ण कार्यों की संख्या			कुँआ	खेत तालाब	जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार, पुर्नजीवन, पुर्नभरण इत्यादि जैसे - लघु तालाब व माईनर नहरों का रखरखाव, जल पुनर्भरण, तालाबों का गहरीकरण व जीर्णोद्धार (गाद निकालने सहित)।
					कुँआ	खेत तालाब	जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार, पुर्नजीवन, पुर्नभरण इत्यादि जैसे - लघु तालाब व माईनर नहरों का रखरखाव, जल पुनर्भरण, तालाबों का गहरीकरण व जीर्णोद्धार (गाद निकालने सहित)।			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सागर	9250	992	842	6231	472	641	139.64	2.27	6.21
2	छतरपुर	14670	2427	210	10671	748	170	175.16	1.72	10.50
3	दमोह	12970	566	1098	8448	185	509	120.11	1.76	20.16
4	टीकमगाढ़	9016	877	525	7385	872	466	94.44	1.30	12.18
5	पन्ना	8303	0	710	6712	0	384	97.97	0.00	14.12
6	दतिया	1220	0	225	510	0	82	5.24	0.00	0.23
	महायोग	55429	4862	3610	39957	2277	2252	632.56	7.05	63.40
										703.01

बुन्देलखण्ड पैकेज अंतर्गत व्यय का विवरण

माह जून 2014 की स्थिति में

क्रमांक	जिले का नाम	वित्तीय लक्ष्य (रु. करोड़ में)			जिले को प्रदाय राशि (रु. करोड़ में)			व्यय राशि (रु. करोड़ में)			लक्ष्य v/s व्यय का प्रतिशत		
		पम्पसेट	स्टापडेम	योग	पम्पसेट	स्टापडेम	योग	पम्पसेट	स्टापडेम	योग	पम्पसेट	स्टापडेम	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	सागर	12.3360	40.17	52.51	12.3360	40.1700	52.5060	11.40	26.95	38.35	92%	67%	73%
2	छतरपुर	18.1620	24.27	42.43	18.1620	24.2700	42.4320	14.30	16.35	30.65	79%	67%	72%
3	दमोह	16.4460	18.55	35.00	16.4460	18.5500	34.9960	14.89	16.50	31.39	91%	89%	90%
4	टीकमगढ़	16.7080	20.88	37.59	16.7080	20.8800	37.5880	14.65	12.78	27.43	88%	61%	73%
5	पन्ना	13.9480	15.78	29.73	13.9480	15.7800	29.7280	9.47	11.04	20.51	68%	70%	69%
6	दतिया	2.4000	10.35	12.75	2.4000	10.3500	12.7500	0.58	6.90	7.48	24%	67%	59%
	योग	80.0000	130.00	210.00	80.0000	130.0000	210.0000	65.29	90.52	155.81	82%	70%	74%

क्र.	आइटम	जारी राशि	व्यय राशि	व्यय का प्रतिशत
1.	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से प्राप्त कुल राशि	210.000	155.81	74%
2.	राज्य सरकार की ओर से जारी राशि	0	-	-
	कुल प्रदाय राशि	210.000	155.81	74%
