


बुन्देलखण्ड पैकेज

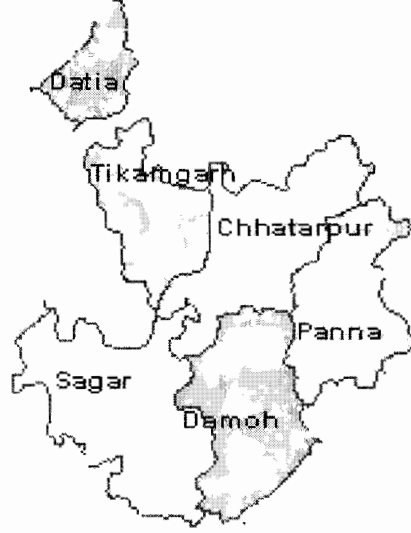

विद्युत/डीजल पम्प सेट प्रदाय एवं स्टाप डेम निर्माण की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

माह मई 2014

बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज प्रथम चरण

कपिल धारा कूओं पर विद्युत/डीजल पम्प प्रदाय

- ✓ कुल प्रावधानित राशि रू. 80 करोड़
- ✓ जिलों को प्रदाय राशि रू. 80 करोड़
- ✓ भौतिक लक्ष्य संख्या – 40,000
- ✓ पूर्ण कूपों की संख्या – 39277 (महात्मा गांधी नरेगा कपिलधारा उपयोजनान्तर्गत)
- ✓ कुल स्थापित पम्पों की संख्या – 33584
- ✓ पम्पसेट प्रदाय हेतु चिन्हित हितग्राहियों की संख्या – 36379
- ✓ व्यय राशि रू. 65.00 करोड़

नदी नालों पर श्रंखलाबद्ध स्टाप डेम— ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विकास आयुक्त कार्यालय से प्राप्त जानकारी के आधार पर

- ✓ कुल प्रावधानित राशि रू. 130 करोड़
- ✓ जिलों को प्रदाय राशि रू 130 करोड़
- ✓ स्टाप डेम की संख्या – 353
- ✓ पूर्ण स्टाप डेम की संख्या – 272
- ✓ प्रगतिरत स्टाप डेम की संख्या—79 (12 फाऊंडेशन लेवल एवं 67 सुपर स्ट्रकचर लेवल)
- ✓ अप्रारंभ स्टाप डेम की संख्या— 02 (टीकमगढ जिले के 02 स्टापडेम अप्रारंभ),
- ✓ कुल व्यय राशि रू. 84.50 करोड़

पम्पसेट प्रदाय एवं स्टापडेम निर्माण की अद्यतन वित्तीय प्रगति

क्र	विवरण	स्वीकृत राशि	ACA से प्राप्त (राशि करोड में)			जिलों को प्रदाय राशि	व्यय	प्रतिशत	उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
			I	II	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पम्प सेट प्रदाय	80.00	45.00	35.00	80.00	080.00	65.00	81%	62.73
2	स्टापडेम निर्माण	130.00	26.40	103.60	130.00	130.00	84.50	65%	82.32
	योग	210.00	71.40	138.60	210.00	210.00	149.50	71%	145.05

Financial & Physical Targets and Achievement as on MAY 2014 (MGNREGA)					
S.No.	Scheme/District	Financial (Rs. In Cr.)		Physical (No.)	
		Target	Actual	Target	Achievement
I	Stop Dam				
1	Sagar	40.17	24.86	84	66
2	Chhatarpur	24.27	15.65	86	70
3	Damoh	18.55	16.50	53	52
4	Tikamgarh	20.88	11.20	67	47
5	Panna	15.78	10.47	35	25
6	Datia	10.35	5.82	28	12
	Total	130.00	84.50	353	272
II	Pump Sets / Lifting Device				
1	Sagar	12.34	11.40	6168	6005
2	Chhatarpur	18.16	14.23	9081	7048
3	Damoh	16.45	14.70	8223	7854
4	Tikamgarh	16.71	14.64	8354	7320
5	Panna	13.95	9.47	6974	5052
6	Datia	2.40	0.56	1200	305
	Total	80.00	65.00	40000	33584
III	Dug Wells				
1	Sagar		139.64	6168	6231
2	Chhatarpur		175.16	9081	10186
3	Damoh		120.11	8223	8305
4	Tikamgarh		94.44	8354	7385
5	Panna		97.97	6974	6712
6	Datia		4.67	1200	458
	Total	0	631.99	40000	39277
IV	Khet Talab				
1	Sagar		2.27	992	472
2	Chhatarpur		1.72	2427	748
3	Damoh		1.76	566	185
4	Tikamgarh		1.30	877	872
5	Panna		0.00	0	0
6	Datia		0.00	0	0
	Total	0	7.05	4862	2277
V	Renovation and Recharging of Dug Wells				
1	Sagar		6.21	842	641
2	Chhatarpur		10.50	210	170
3	Damoh		20.16	1098	509
4	Tikamgarh		12.18	525	466
5	Panna		14.12	710	384
6	Datia		0.23	225	82
	Total	0	63.40	3610	2252

बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज द्वितीय चरण

बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज फेस -2 (वर्ष 2013-14 से वर्ष 2016-17 तक) अंतर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ACA) की राशि के अभिसरण से विद्युत/डीजल पम्प सेट प्रदाय हेतु जिलेवार भौतिक लक्ष्य एवं वित्तीय लक्ष्य निम्नानुसार निर्धारित किया गया है। प्रथम किश्त के रूप में राशि रु. 4.15 करोड़ प्राप्त हुई हैं।

क्रमांक	जिले का नाम	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (करोड में)
1	2	3	4
1	सागर	1417	3.5425
2	छतरपुर	2820	7.0500
3	दमोह	1906	4.7650
4	टीकमगढ	1939	4.8475
5	पन्ना	1618	4.0450
6	दतिया	300	0.7500
	योग	10000	25.0000
