


# बुन्देलखण्ड पैकेज

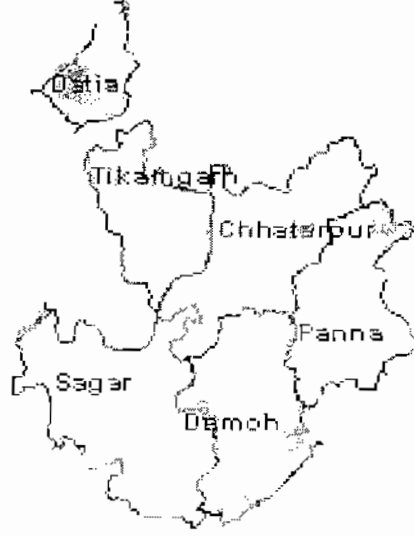

विद्युत/डीजल पम्प सेट प्रदाय एवं स्टाप डेम निर्माण की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

माह सितम्बर 2014

## बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज प्रथम चरण

### कपिल धारा कूओं पर विद्युत/डीजल पम्प प्रदाय

- ✓ कुल प्रावधानित राशि रु. 80 करोड़
- ✓ जिलों को प्रदाय राशि रु. 80 करोड़
- ✓ भौतिक लक्ष्य संख्या – 40,000
- ✓ पूर्ण कूपों की संख्या – 40660 (गहात्मा गांधी नरेगा कपिलधारा उपयोजना-तर्गत)
- ✓ कुल स्थापित पम्पों की संख्या – 34416
- ✓ पम्पसेट प्रदाय हेतु चिन्हित हितग्राहियों की संख्या – 37369
- ✓ लक्ष्य पूर्ति हेतु शेष पम्पों की संख्या –5584
- ✓ व्यय राशि रु. 66.78 करोड़

### नदी नालों पर श्रंखलाबद्ध स्टाप डेम- ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विकास आयुक्त कार्यालय से प्राप्त जानकारी के आधार पर

- ✓ कुल प्रावधानित राशि रु. 130 करोड़
- ✓ जिलों को प्रदाय राशि रु 130 करोड़
- ✓ स्टाप डेम की संख्या – 353
- ✓ पूर्ण स्टाप डेम की संख्या – 315
- ✓ प्रगतिरत स्टाप डेम की संख्या-36 (9 फाऊंडेशन लेवल एवं 27 सुपर स्ट्रक्चर लेवल)
- ✓ अप्रारंभ स्टाप डेम की संख्या- 02 (टीकमगढ़ जिले के 02 अप्रारंभ स्टापडेम निरस्त किये जा चुके हैं),
- ✓ कुल व्यय राशि रु. 100.47 करोड़

#### पम्पसेट प्रदाय एवं स्टापडेम निर्माण की अद्यतन वित्तीय प्रगति

क्र	विवरण	स्वीकृत राशि	ACA से प्राप्त (राशि करोड़ में)			जिलों को प्रदाय राशि	व्यय	प्रतिशत	उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
			I	II	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पम्प सेट प्रदाय	80.00	45.00	35.00	80.00	080.00	66.78	83%	65.35
2	स्टापडेम निर्माण	130.00	26.40	103.60	130.00	130.00	100.47	77%	87.30
	<b>योग</b>	<b>210.00</b>	<b>71.40</b>	<b>138.60</b>	<b>210.00</b>	<b>210.00</b>	<b>167.25</b>	<b>80%</b>	<b>152.65</b>

**Financial & Physical Targets and Achievement as on September 2014  
(MGNREGA) (First phase)**

S.No.	Scheme/District	Financial (Rs. In Cr.)		Physical (No.)	
		Target	Actual	Target	Achievement
<b>I</b>	<b>Stop Dam</b>				
1	Sagar	40.17	29.44	84	73
2	Chhatarpur	24.27	19.41	86	81
3	Damoh	18.55	16.56	53	53
4	Tikamgarh	20.88	15.27	67	60
5	Panna	15.78	11.93	35	30
6	Datia	10.35	7.86	28	18
	<b>Total</b>	<b>130.00</b>	<b>100.47</b>	<b>353</b>	<b>315</b>
<b>II</b>	<b>Pump Sets / Lifting Device</b>				
1	Sagar	13.14	11.63	6568	6005
2	Chhatarpur	18.16	14.62	9081	7543
3	Damoh	16.45	15.27	8223	8034
4	Tikamgarh	17.51	14.65	8754	7327
5	Panna	13.95	10.03	6974	5199
6	Datia	0.80	0.58	400	308
	<b>Total</b>	<b>80.00</b>	<b>66.78</b>	<b>40000</b>	<b>34416</b>
<b>III</b>	<b>Dug Wells</b>				
1	Sagar		140.93	6568	6568
2	Chhatarpur		198.25	9081	11014
3	Damoh		133.88	8223	8471
4	Tikamgarh		120.30	8754	7385
5	Panna		97.97	6974	6712
6	Datia		5.24	400	510
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>696.58</b>	<b>40000</b>	<b>40660</b>
<b>IV</b>	<b>Khet Talab</b>				
1	Sagar		2.27	992	472
2	Chhatarpur		1.72	2427	748
3	Damoh		1.76	566	185
4	Tikamgarh		1.30	877	872
5	Panna		0.00	0	0
6	Datia		0.00	0	0
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>7.05</b>	<b>4862</b>	<b>2277</b>
<b>V</b>	<b>Renovation and Recharging of Dug Wells</b>				
1	Sagar		6.21	842	641
2	Chhatarpur		10.50	210	170
3	Damoh		20.16	1098	509
4	Tikamgarh		12.18	525	466
5	Panna		14.12	710	384
6	Datia		0.23	225	82
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>63.40</b>	<b>3610</b>	<b>2252</b>

**बुन्देलखण्ड पैकेज अंतर्गत  
ACA मद से  
पम्प सेट प्रदाय की वित्तीय प्रगति (प्रथम चरण)**

माह सितम्बर 2014 की स्थिति में

प्रपत्र - 01

क्रमांक	जिले का नाम	वित्तीय लक्ष्य (करोड़ में)	जिले को प्रदाय राशि (करोड़ में)	पम्प सेट हेतु एसीए मद से विमुक्त अनुदान की राशि (करोड़ में)
1	2	3	4	5
1	सागर	13.1360	13.136	11.63
2	छत्तरपुर	18.1620	18.162	14.62
3	दमोह	16.4460	16.446	15.27
4	टीकमगढ़	17.5080	17.508	14.65
5	पन्ना	13.9480	13.948	10.03
6	दतिया	0.8000	0.800	0.58
<b>योग</b>		<b>80.00</b>	<b>80.00</b>	<b>66.78</b>

**बुन्देलखण्ड पैकेज अंतर्गत  
ACA मद से  
पम्प सेट प्रदाय की भौतिक प्रगति (प्रथम चरण)**

माह सितम्बर 2014 की स्थिति में		प्रपत्र - 02				
क्र	जिले का नाम	भौतिक लक्ष्य	स्वीकृत कूप	पूर्ण कूप	कुल पम्प स्थापित	चिन्हांकित हितग्राहियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	सागर	6568	9250	6568	6005	6168
2	छतरपुर	9081	14717	11014	7543	8640
3	दमोह	8223	13073	8471	8034	8449
4	टीकमगढ	8754	9090	7385	7327	8354
5	पन्ना	6974	8303	6712	5199	5351
6	दतिया	400	1220	510	308	407
<b>योग</b>		<b>40000</b>	<b>55653</b>	<b>40660</b>	<b>34416</b>	<b>37369</b>

**प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल**  
**बुन्देलखण्ड पैकेज अंतर्गत ACA मद से स्टापडेम निर्माण वित्तीय प्रगति (प्रथम चरण)**  
**माह सितम्बर 2014 की स्थिति में**  
**प्रपत्र - 03**

क्र.	संभाग	जिला	वित्तीय लक्ष्य राशि (करोड़ में)	जिले को प्रदाय राशि (करोड़ में)	व्यय (करोड़ में)
1	2	3	4	5	6
1	सागर	सागर	40.17	40.17	29.44
2		छतरपुर	24.27	24.27	19.41
3		दमोह	18.55	18.55	16.56
4		टीकमगढ	20.88	20.88	15.27
5		पन्ना	15.78	15.78	11.93
		<b>योग</b>	<b>119.65</b>	<b>119.65</b>	<b>92.61</b>
6	खालियर	दतिया	10.35	10.35	7.86
		<b>महायोग</b>	<b>130.00</b>	<b>130.00</b>	<b>100.47</b>

**प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल**  
**बुन्देलखण्ड पैकेज अंतर्गत ACA मद से स्टापडेम निर्माण की भौतिक प्रगति (प्रथम चरण)**  
**माह सितम्बर 2014 की स्थिति में**

प्रपत्र - 04

क्र.	संभाग	जिला	भौतिक लक्ष्य	स्वीकृत कार्यों की संख्या	प्रगतिरत कार्यों की संख्या	पूर्ण कार्यों की संख्या	भौतिक प्रगति		
							अप्रारंभ	फाऊंडेशन लेवल	सुपर स्ट्रक्चर लेवल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सागर	सागर	84	84	11	73	0	6	5
2		छतरपुर	86	86	5	81	0	0	5
3		दमोह	53	53	0	53	0	0	0
4		टीकमगढ़	67	67	5	60	2	1	4
5		पन्ना	35	35	5	30	0	0	5
		<b>योग</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>26</b>	<b>297</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>19</b>
6	ग्वालियर	दतिया	28	28	10	18	0	2	8
		<b>महायोग</b>	<b>353</b>	<b>353</b>	<b>36</b>	<b>315</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>27</b>

नोट -- टीकमगढ़ जिले के 02 कार्य निरस्त किये गये हैं। सागर जिले में 02 कार्य डूब क्षेत्र अंतर्गत हैं।

## MGNREGS अंतर्गत सम्पन्न कार्य (प्रथम चरण)

माह सितम्बर 2014 की स्थिति में

प्रपत्र -05

क्र.	जिले का नाम	स्वीकृत कार्यों का विवरण			पूर्ण कार्यों का विवरण					
		कुँआ	खेत तालाब	जल संवर्द्धन के कार्य	पूर्ण कार्यों की संख्या			पूर्ण कार्यों पर व्यय राशि (करोड़ में)		
					कुँआ	खेत तालाब	जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार, पुर्नजीवन, पुर्नभरण इत्यादि जैसे - लघु तालाब व माईनर नहरों का रखरखाव, जल पुनर्भरण, तालाबों का गहरीकरण व जीर्णोद्धार (गाद निकालने सहित)।		कुँआ	खेत तालाब
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सागर	9250	992	842	6568	472	641	140.93	2.27	6.21
2	छतरपुर	14717	2427	210	11014	748	170	198.25	1.72	10.50
3	दमोह	13073	566	1098	8471	185	509	133.88	1.76	20.16
4	टीकमगढ़	9090	877	525	7385	872	466	120.30	1.30	12.18
5	पन्ना	8303	0	710	6712	0	384	97.97	0.00	14.12
6	दतिया	1220	0	225	510	0	82	5.24	0.00	0.23
	<b>महायोग</b>	<b>55653</b>	<b>4862</b>	<b>3610</b>	<b>40660</b>	<b>2277</b>	<b>2252</b>	<b>696.58</b>	<b>7.05</b>	<b>63.40</b>
										<b>767.03</b>



**बुन्देलखण्ड पैकेज अंतर्गत व्यय का विवरण (प्रथम चरण)**

माह: नवम्बर 2014 की स्थिति में

क्र.सं.	जिले का नाम	वित्तिय लब्ध (₹ करोड़ में)			जिले को प्रदाय राशि (₹ करोड़ में)			व्यय राशि (₹ करोड़ में)			लब्ध v/s व्यय का प्रतिशत		
		उत्थारण	स्थापनेम	योग	पन्चशत	स्थापनेम	योग	पन्चशत	स्थापनेम	योग	पन्चशत	स्थापनेम	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	सागर	13.1360	40.17	53.31	13.1360	40.1700	53.3060	11.63	29.44	41.07	89%	73%	77%
2	छत्तपुर	18.1620	24.27	42.43	18.1620	24.2700	42.4320	14.62	19.41	34.03	80%	80%	80%
3	दमोह	16.4460	18.55	35.00	16.4460	18.5500	34.9960	15.27	16.56	31.83	93%	89%	91%
4	दौकमगढ	17.5080	20.88	38.39	17.5080	20.8800	38.3880	14.65	15.27	29.92	84%	73%	78%
5	तन्ना	13.9480	15.78	29.73	13.9480	15.7800	29.7280	10.03	11.93	21.96	72%	76%	74%
6	इरिया	0.8000	10.35	11.15	0.8000	10.3500	11.1500	0.58	7.86	8.44	73%	76%	76%
	<b>योग</b>	<b>80.0000</b>	<b>130.00</b>	<b>210.00</b>	<b>80.0000</b>	<b>130.0000</b>	<b>210.0000</b>	<b>66.78</b>	<b>100.47</b>	<b>167.25</b>	<b>83%</b>	<b>77%</b>	<b>80%</b>

क्र.	आइटम	जारी राशि	व्यय राशि	व्यय का प्रतिशत
1	अतिरिक्त केन्द्रीय अनुदान से प्राप्त कुल राशि	210.000	167.25	80%
2	राज्य स्तर पर जी.ओ.एस. से जारी राशि	0	-	-
	<b>कुल प्रदाय राशि</b>	<b>210.000</b>	<b>167.25</b>	<b>80%</b>

**Allocation, Released and Expenditure of funds from ACA, CS/CSS, MNREGA components to MP (As on 30.09. 2014) (Rs. In Cr.)**

S N.	Department	Approved Budget	Additional central Assistance			CS/CSS Schemes			MGNREGA			UC
			Allocation	Released	Actual	Allocation	Released	Actual	Allocation	Released	Actual	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Rural</b>											
i)	Supply of pump sets	80.00	80.00	80.00	66.30							65.35
ii)	Construction of Stop Dams	130.00	130.00	130.00	100.47							87.30
iii)	Construction of New Dug Wells	200.00							200.00	696.58	696.58	
iv)	Watershed Management	480.00				480.00	101.26	82.42				82.42
v)	Farm Ponds	90.00							90.00	7.05	7.05	
vi)	Renovation and Recharging of dug Wells	320.00							320.00	63.40	63.40	
	<b>Total</b>	<b>1300.00</b>	<b>210.00</b>	<b>210.00</b>	<b>166.77</b>	<b>480.00</b>	<b>101.26</b>	<b>82.42</b>	<b>610.00</b>	<b>767.03</b>	<b>767.03</b>	<b>235.07</b>

Note :- 1. In MGNREGA no allotment is released for particular work, therefore actual expenditure has been assumed as released fund.

2. Details of watershed management are, as per information given by Director RGM.

## बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज द्वितीय चरण

बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज फेस -2 (वर्ष 2013-14 से वर्ष 2016-17 तक) अंतर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ACA) की राशि के अभिसरण से विद्युत/डीजल पम्प सेट प्रदाय हेतु जिलेवार भौतिक लक्ष्य एवं वित्तीय लक्ष्य निम्नानुसार निर्धारित किया गया है। प्रथम किश्त के रूप में राशि रू. 4.15 करोड़ प्राप्त हुई है। प्रथम चरण की लक्ष्य पूर्ति उपरांत ही द्वितीय चरण के विद्युत/डीजल पम्प सेट प्रदाय की कार्यवाही प्रारंभ की जावेगी।

क्रमांक	जिले का नाम	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (करोड में )
1	2	3	4
1	सागर	1417	3.5425
2	छतरपुर	2820	7.0500
3	दमोह	1906	4.7650
4	टीकमगढ़	1939	4.8475
5	पन्ना	1618	4.0450
6	दतिया	300	0.7500
	<b>योग</b>	<b>10000</b>	<b>25.0000</b>
